PROYECTO MVP - FOOD DELIVERY APP

Estructura de Equipo Scrum y Planificación del Sprint 1

Definición de roles, Product Backlog y hoja de ruta de ejecución técnica.

Gemini Notebook

Product Owner (PO)

Omar Burgos

Foco: Maximizar valor. Define la visión, prioriza el backlog y es el único que acepta/rechaza el incremento. Representa a usuarios y restaurantes.

Scrum Master (SM)

César Velasco

Foco: Eficiencia del marco. Facilita eventos, elimina impedimentos y protege al equipo de interrupciones externas.

Equipo de Desarrollo (Devs)

Foco: Construcción técnica autoorganizada.

Rolo Huarachi

Backend, Base de Datos, APIs y lógica de pedidos.

Carlos Aramayo

Frontend, App Móvil, UI del cliente.


Adrián Rojas

Full-stack, UX/UI, QA, pruebas y despliegue.

Gemini Notebook

	Product Owner	Scrum Master	Developers
¿Qué gestionan?	El Qué del producto (Visión y valor de negocio).	El Proceso y los eventos (Salud del marco Scrum).	El Cómo técnico (Arquitectura, código y calidad).
Entregable principal	Product Backlog priorizado y claro.	Un equipo ágil, enfocado y sin bloqueos.	Incremento de producto funcional y probado.
Límite de autoridad	🛡️ Único perfil autorizado para aceptar o rechazar historias terminadas.	🛡️ No asigna tareas técnicas ni evalúa desempeño; facilita el flujo.	🛡️ Únicos perfiles autorizados para estimar el esfuerzo técnico de las tareas.

Gemini Notebook

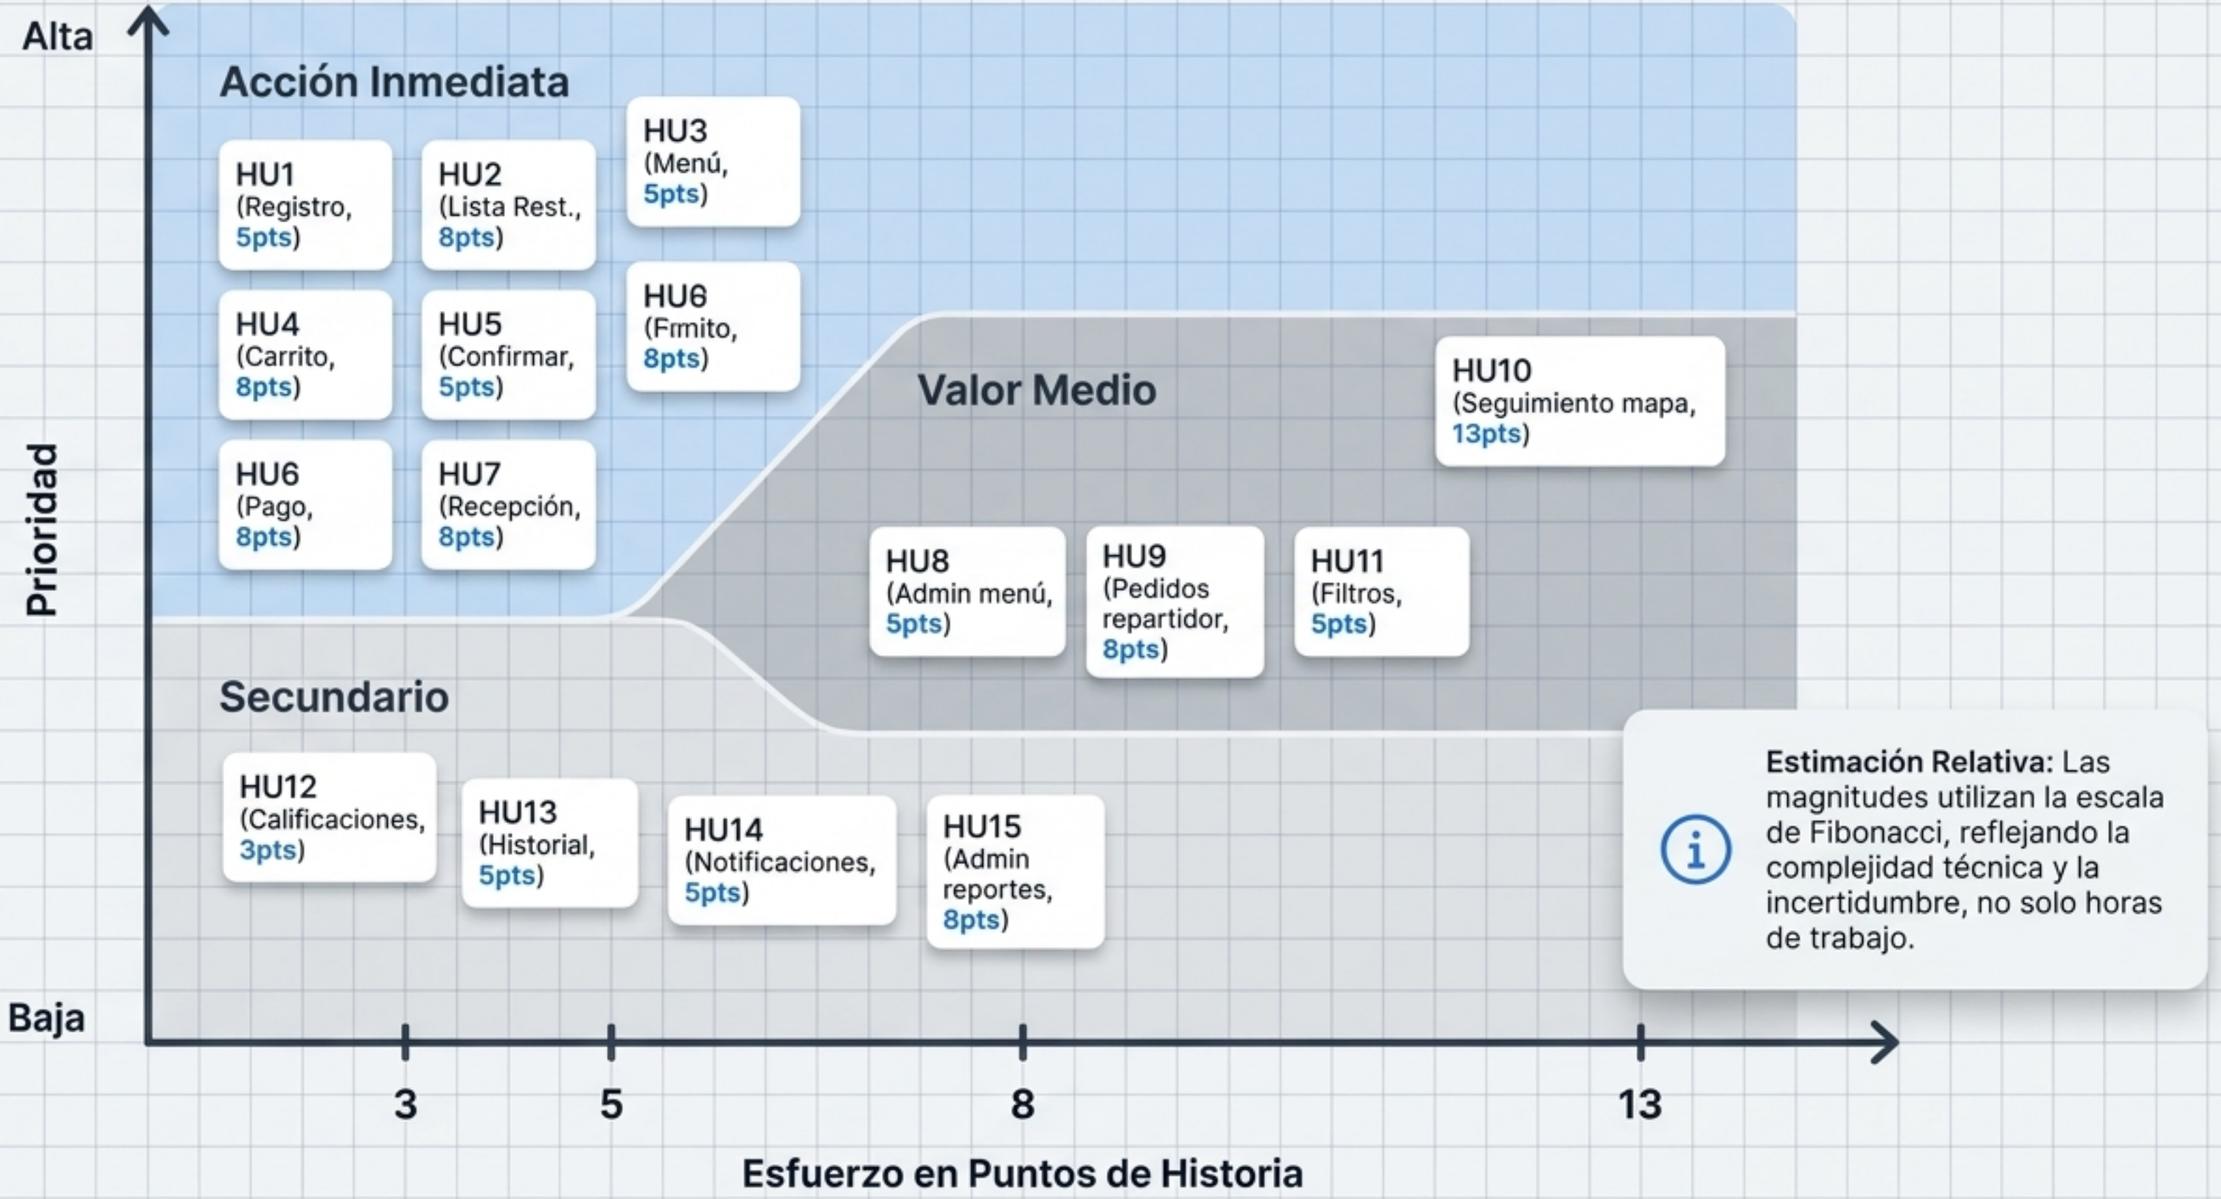

Gemini Notebook



Sprint Goal: Permitir que un cliente nuevo se registre, explore restaurantes cercanos y agregue productos a un carrito funcional, entregando una app navegable con backend operativo.

Parámetros de Ejecución

Duración: 2 semanas (10 días hábiles).

Capacidad del Equipo: 26 puntos de historia.

Alcance Seleccionado

- [HU1] Registro/Login (5 pts)
- [HU2] Catálogo de restaurantes (8 pts)
- [HU3] Búsqueda / Menú (5 pts)
- [HU4] Carrito de compras (8 pts)

Total Comprometido: 26 puntos.

Gemini Notebook

Sprint Backlog: Ejecución del Tablero

Backend / API (Rolo Huarachi)

- Crear API autenticación (JWT) y BD (1.2) — **12h** — En curso
- Modelo datos restaurantes y endpoints (2.1) — **8h** — Terminada
- Índice de búsqueda en BD (3.1) — **6h** — En curso

Frontend / UI (Carlos Aramayo)

- Implementar vistas registro/login (1.3) — **10h** — En curso
- Lista de tarjetas y geolocalización (2.2) — **14h** — Pendiente
- Barra de búsqueda e interfaz (3.2) — **8h** — Pendiente
- Lógica estado global del carrito (4.2) — **10h** — Pendiente

Full-stack / UX / QA (Adrián Rojas)

- Diseñar pantallas registro/login - Wireframes (1.1) — **8h** — Terminada
- Pruebas visualización carga imágenes (2.3) — **5h** — Pendiente
- Pruebas integración flujo completo E2E (4.3) — **6h** — Pendiente

Terminada · En curso · Pendiente

Gemini Notebook

HU1 (Registro/Login)	Dado que soy usuario nuevo, cuando ingreso datos válidos, entonces se crea la cuenta. Restricción: Contraseña cifrada; correo único.
HU2 (Lista Restaurantes)	Dado que abro la app principal, entonces veo restaurantes con foto y categoría. Restricción: Carga < 3s; ocultar locales cerrados.
HU3 (Menú)	Dado que selecciono un restaurante, entonces veo platos, precios y fotos. Restricción: Conservar estado del carrito al volver.
HU4 (Carrito de compras)	Cuando agrego/quito un plato, el subtotal se actualiza en tiempo real. Restricción: Bloqueo multidominio (alerta al mezclar restaurantes).

Gemini Notebook

Definition of Done (DoD) - Criterios de Terminado

Security Gate

1. Código Revisado
Peer review completada y aprobada por otro integrante del equipo de desarrollo (evitar silos).

2. Pruebas Superadas
Pruebas unitarias, manuales y automáticas (E2E) ejecutadas exitosamente sin fallos críticos.

3. Despliegue Técnico
Funcionalidad integrada y desplegada en ambiente de pruebas (Staging), lista para usar.

4. Aceptación de Negocio
Criterios validados físicamente y firmados por el Product Owner (Omar).

Gemini Notebook

Ritmo de Ejecución (Cadencia de 2 Semanas)



Sprint Planning

Inicio - Día 1

Duración: 4 horas

Objetivo: Acordar Sprint Goal y seleccionar tareas del Backlog.

Daily Scrum

Días 1 al 10

Duración: 15 min diarios

Objetivo: Sincronización técnica (Ayer, Hoy, Impedimentos).

Sprint Review

Fin - Día 10 Mañana

Duración: 2 horas

Objetivo: Demostración del software funcional (App/Backend) a stakeholders.

Sprint Retrospective

Fin - Día 10 Tarde

Duración: 1.5 horas

Objetivo: Análisis interno del equipo e iterar mejoras para Sprint 2.

Gemini Notebook

READY



Fundación Técnica

Repositorio configurado, modelo de Base de Datos inicial diseñado y arquitectura de despliegue definida.

READY

READY



Alineación y Compromiso

3 Desarrolladores listos. 1 PO y 1 SM alineados. Foco absoluto (26 puntos) en el flujo crítico del cliente.

READY

READY



Próximo Paso Inmediato

Arranque formal del Sprint 1 enfocado en la entrega de HU1 (Auth) a HU4 (Carrito).

READY

System Ready

La agilidad reside en entregar valor funcional constante. Objetivo del equipo: Aplicación navegable en 2 semanas.

Gemini Notebook
